

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM
Trách nhiệm của người đứng đầu UBND phường Cẩm Thành
trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Tôi tên: Nguyễn Văn Hưng;

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành.

Đơn vị đang công tác: UBND phường Cẩm Thành.

Thực hiện Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; trong đó yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Nay, tôi tự kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân - là người đứng đầu UBND phường Cẩm Thành, trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

1. Về nội dung khuyết điểm:

Chậm triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

2. Nguyên nhân của khuyết điểm:

- Năm 2025, sau khi thành lập UBND phường Cẩm Thành) trên cơ sở sáp nhập nguyên hiện trạng 04 phường: Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo), tập thể lãnh đạo UBND phường, Chủ tịch UBND phường đã tập trung chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 đã được UBND phường trình HĐND phường Cẩm Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành. Bước vào đầu năm 2026, với trách nhiệm người đứng đầu UBND phường Cẩm Thành, tôi đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Cẩm Thành. Tuy nhiên, khi bắt tay vào để triển khai thực hiện các công trình đầu năm 2026, nhận thấy quá trình rà soát, đề xuất lập danh mục các công trình đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 có một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn thực hiện của địa phương và so với nguồn lực đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách phường. Do đó, UBND phường đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tập trung rà soát lại toàn bộ danh mục đầu

tư trung hạn 2026 - 2030 để xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND phường Cẩm Thành cho phép điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Sau khi hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh danh mục, UBND phường đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến thống nhất trình HĐND phường thông qua. Tuy nhiên, do giai đoạn ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nên chưa thể trình kỳ họp chuyên đề thông qua. Sau khi hoàn thành công tác bầu cử, HĐND phường tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung các nội dung bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường. Vì vậy, UBND phường đã trình xin tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ngày 16/4/2026, HĐND phường đã tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND phường Cẩm Thành, khóa II (kỳ họp chuyên đề) để thông qua và đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/4/2026 của HĐND phường về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành. Vì vậy, đã kéo dài thời gian triển khai thực hiện các công trình, dự án của năm 2026.

3. Tính chất, mức độ của khuyết điểm, trách nhiệm và biện pháp, giải pháp khắc phục; tự nhận hình thức kỷ luật:

3.1. Tính chất, mức độ của khuyết điểm:

Việc chậm triển khai công tác đầu tư công năm 2026 dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.2. Trách nhiệm cá nhân:

Bản thân là người đứng đầu UBND phường - là người trực tiếp phê duyệt chủ trương đầu tư vì những nguyên nhân nêu trên, chưa kịp thời triển khai theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra.

3.3. Biện pháp, giải pháp khắc phục:

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tập trung tham mưu triển khai công tác đầu tư công năm 2026; chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung triển khai các công trình được giao; đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công theo đúng tiến độ Tỉnh giao. Kết quả, đến ngày 27/6/2026 đã thực hiện giải ngân:

(1) Tổng vốn đã bố trí giải ngân đầu tư: 7.854 triệu đồng, trong đó: vốn Tỉnh đã phân bổ 2.850 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách phường năm 2025 phân bổ 5.004 triệu đồng.

(2) Đã thực hiện giải ngân đến ngày 27/6/2026 là 3.821 triệu/7.854 triệu đồng, bằng 48,6% (nguồn vốn đã được bố trí); trong đó: vốn của tỉnh bố trí đã giải ngân là 1.456 triệu đồng/2.850 triệu đồng, bằng 51,09%; vốn từ nguồn tăng thu 2.365 triệu/5.004

triệu, bằng 47,26%.

- Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các công trình thực hiện đầu tư năm 2026; chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.4. Tự nhận hình thức kỷ luật: Phê bình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Trên đây là bản kiểm điểm trách nhiệm của bản thân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2026

Người viết kiểm điểm



Nguyễn Văn Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

**Trách nhiệm của cấp phó người đứng đầu UBND phường Cẩm Thành
trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026**

Tôi tên: Hoàng Ngô Khánh Phúc.

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành.

Đơn vị đang công tác: UBND phường Cẩm Thành.

Thực hiện Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; trong đó yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Nay, tôi tự kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân - là Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, được phân công phụ trách lĩnh vực Xây dựng – Công thương (chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các dự án đầu tư công sau khi được Chủ tịch UBND phường quyết định chủ chương đầu tư dự án), trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

1. Về nội dung khuyết điểm:

Chậm chỉ đạo triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

2. Nguyên nhân chủ quan, khách quan của khuyết điểm:

2.1. Về khách quan:

Năm 2025, sau khi thành lập UBND phường Cẩm Thành (trên cơ sở sáp nhập nguyên hiện trạng 04 phường: Nghĩa Chánh, Chánh Lộ, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo); Tôi cùng với tập thể lãnh đạo UBND phường đã tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, tham mưu lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 trình HĐND phường Cẩm Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được HĐND phường Cẩm Thành khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét thông qua và ban hành tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Trong quá trình tổ chức triển khai danh mục các công trình đầu tư thực hiện năm 2026 mới phát hiện quá trình rà soát, đề xuất lập danh mục các công trình đưa vào đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 có một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn thực hiện của địa phương và so với nguồn lực đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách phường. Do đó, tôi cùng với tập thể lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tập trung rà soát lại toàn bộ danh mục đầu tư trung hạn 2026 - 2030 để trình Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND phường Cẩm Thành cho phép điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, nguồn lực của địa phương. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm ban hành các Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục Kế hoạch năm 2026, nên không thể phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của phường không đảm bảo theo mức giải ngân bình quân chung của tỉnh.

2.2. Về chủ quan:

Bản thân tôi được phân công phụ trách lĩnh vực Xây dựng – Công thương - là người trực tiếp phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách (*chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, theo dõi các dự án đầu tư công sau khi được Chủ tịch UBND phường ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án*). Công tác triển khai đầu tư công được xác định là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tôi đã tích cực hỗ trợ, đề xuất cho đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhưng nhân sự phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - cơ quan chuyên môn tham mưu trực tiếp công tác đầu tư công chỉ có 01 Phó trưởng phòng có chuyên môn về công tác đầu tư, xây dựng; vì công việc chuyên môn của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quá nhiều nên việc tham mưu có chậm trễ so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

3. Tính chất, mức độ của khuyết điểm, trách nhiệm và biện pháp, giải pháp khắc phục; tự nhận hình thức kỷ luật:

3.1. Tính chất, mức độ của khuyết điểm:

Việc chậm triển khai công tác đầu tư công năm 2026 dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.2. Trách nhiệm cá nhân:

Bản thân là cấp phó của Người đứng đầu UBND phường - là người không trực tiếp phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng bản thân nhận thấy có một phần trách nhiệm trong việc hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc phòng chuyên môn có lúc chưa kịp thời, dẫn đến chậm ban hành các Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục Kế hoạch năm 2026, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của phường không đảm bảo theo mức giải ngân bình quân chung của tỉnh.

3.3. Biện pháp, giải pháp khắc phục:

- Sau khi có Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; trong đó yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tôi đã tích cực chỉ đạo phòng chuyên môn tập trung tham mưu triển khai nhiệm vụ đầu tư công năm 2026; chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung triển khai các công trình được giao theo kế hoạch. Đến nay đã tham mưu ban hành 16/25 Quyết định chủ trương đầu tư các công trình thực hiện năm 2026.

Sau khi Chủ tịch UBND phường ban hành các Quyết định chủ trương đầu tư. Bản thân tôi đã tập trung chỉ đạo đơn vị được giao Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư. Kết quả đến ngày 28/6/2026 đã thực hiện giải ngân:

(1) Tổng vốn bố trí giải ngân đầu tư công được bố trí: 7.854 triệu đồng, trong đó: vốn Tỉnh đã phân bổ 2.850 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách phường năm 2025 phân bổ 5.004 triệu đồng.

(2) Đã thực hiện giải ngân đến ngày 27/6/2026 là 3.821 triệu/7.854 triệu đồng, bằng 48,6% (nguồn vốn đã được bố trí); trong đó: vốn của tỉnh bố trí đã giải ngân là 1.456 triệu đồng/2.850 triệu đồng, bằng 51,09%; vốn từ nguồn tăng thu 2.365 triệu/5.004 triệu, bằng 47,26%.

- Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các công trình thực hiện đầu tư năm 2026; chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.4. Tự nhận hình thức kỷ luật: Nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trên đây là bản kiểm điểm trách nhiệm của bản thân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2026

Người viết kiểm điểm



Hoàng Ngô Khánh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Trách nhiệm của Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Cẩm Thành - đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Tôi tên: Phạm Gia Long;

Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Cẩm Thành.

Đơn vị đang công tác: Văn phòng HĐND&UBND phường Cẩm Thành.

Thực hiện Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; Công văn số 408/VHXXH ngày 18/6/2026 của phòng VHXXH phường Cẩm Thành về việc thực hiện Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; *trong đó yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.*

Nay, tôi tự kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân - là Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường Cẩm Thành - đại diện Chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án được giao trong năm 2026, trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

1. Về nội dung khuyết điểm:

Chậm triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

2. Nguyên nhân của khuyết điểm:

Bước vào đầu năm 2026, Văn phòng HĐND&UBND phường được UBND phường giao làm Chủ đầu tư các công trình, dự án thực hiện năm 2026; với trách nhiệm là đơn vị Chủ đầu tư, tôi đã phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trong quá trình tham mưu UBND phường thực hiện. Tuy nhiên, do danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 có một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn thực hiện của địa phương và so với nguồn lực đầu tư được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách phường. Nên, thời gian triển khai chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Đến ngày 16/4/2026, HĐND phường đã tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND phường Cẩm Thành, khóa II (kỳ họp chuyên đề) để thông qua và đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/4/2026 của HĐND phường về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Cẩm Thành. Vì vậy, đã kéo dài thời gian triển khai

thực hiện các công trình, dự án của năm 2026. Nguồn vốn chưa được phân bổ cho Chủ đầu tư thực hiện.

3. Tính chất, mức độ của khuyết điểm, trách nhiệm và biện pháp, giải pháp khắc phục; tự nhận hình thức kỷ luật:

3.1. Tính chất, mức độ của khuyết điểm:

Việc chậm triển khai công tác đầu tư công năm 2026 dẫn đến chậm bố trí vốn để thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.2. Trách nhiệm cá nhân:

Bản thân là Chánh Văn phòng - đại diện chủ đầu tư, chưa triển khai giải ngân vốn theo đúng tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND phường, vì vốn chưa được phân bổ theo đúng yêu cầu.

3.3. Biện pháp, giải pháp khắc phục:

- Tập trung triển khai công tác đầu tư công năm 2026 đủ điều kiện thực hiện theo chỉ đạo của UBND phường; tập trung triển khai các công trình được giao; đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công theo đúng tiến độ. Kết quả, đến ngày 27/6/2026 đã thực hiện giải ngân:

(1) Tổng vốn đã bố trí giải ngân đầu tư: 7.854 triệu đồng, trong đó: vốn Tỉnh đã phân bổ 2.850 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách phường năm 2025 phân bổ 5.004 triệu đồng.

(2) Đã thực hiện giải ngân đến ngày 27/6/2026 là 3.821 triệu/7.854 triệu đồng, bằng 48,6% (nguồn vốn đã được bố trí); trong đó: vốn của tỉnh bố trí đã giải ngân là 1.456 triệu đồng/2.850 triệu đồng, bằng 51,09%; vốn từ nguồn tăng thu 2.365 triệu/5.004 triệu, bằng 47,26%.

- Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các công trình thực hiện đầu tư năm 2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công đúng chỉ đạo.

3.4. Tự nhận hình thức kỷ luật: Phê bình, nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Trên đây là bản kiểm điểm trách nhiệm của bản thân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2026
Người viết kiểm điểm

Phạm Gia Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Thành, ngày 17 tháng 6 năm 2026

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên là: Lê Thị Kim Chi.

Chức vụ: Trưởng phòng.

Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Thành

Nay tôi tự kiểm điểm trách nhiệm của bản thân với nội dung như sau:

1. Nội dung kiểm điểm

Trong 06 tháng đầu năm 2026, với vai trò là Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Thành, tôi chịu trách nhiệm chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, trong đó có công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công UBND phường Cẩm Thành chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch vốn đầu tư công, bản thân nhận thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thật sự sâu sát; việc chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chưa kịp thời.

2. Hình thức tự kiểm điểm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm.

3. Giải trình nội dung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, với vai trò là Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Thành, bản thân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công chức trong đơn vị thực hiện công tác tham mưu UBND phường triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đầu tư công; trong đó chú trọng việc rà soát, tham mưu bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tình hình thực tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, tiến độ giải ngân chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình thực hiện phải tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn, sắp xếp lại danh mục các nhiệm vụ, dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc bố trí vốn đúng trọng tâm, phù hợp với định hướng phát triển và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình tổ chức mới, khối lượng công việc được giao nhiều, phạm vi nhiệm vụ rộng, yêu cầu tham mưu xử lý công việc ngày càng cao. Đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ đầu tư công còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn trong công tác theo dõi, tổng hợp, tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến kế hoạch vốn, dẫn đến việc tham mưu, phối hợp triển khai một số nhiệm vụ có thời điểm chưa kịp thời.

Ngoài các nguyên nhân khách quan nêu trên, bản thân nhận thấy với trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa kịp thời dự báo những khó khăn phát sinh để có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

Bản thân nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ công chức; chủ động rà soát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn được giao.

Người tự kiểm điểm



Lê Thị Kim Chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Trách nhiệm của cá nhân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Tôi tên: Lê Minh Túc.

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng.

Đơn vị đang công tác: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Thành.

Thực hiện Thông báo số 591/TB-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết luận Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; trong đó yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Nay, tôi tự kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

1. Về nội dung khuyết điểm:

Chậm tham mưu triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

2. Nguyên nhân chủ quan, khách quan của khuyết điểm:

Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công có sự rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn, sắp xếp lại danh mục nhiệm vụ, dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc bố trí vốn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình tổ chức mới, khối lượng nhiệm vụ phát sinh nhiều, yêu cầu công việc cao; công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch vốn còn gặp một số khó khăn do đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, hoạt động xây dựng còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn.

3. Tính chất, mức độ của khuyết điểm, trách nhiệm và biện pháp, giải pháp khắc phục; tự nhận hình thức kỷ luật:

3.1. Tính chất, mức độ của khuyết điểm:

Việc chậm triển khai công tác đầu tư công năm 2026 dẫn đến chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.2. Trách nhiệm cá nhân:

Bản thân là người tham mưu triển khai thực hiện các công trình thực hiện đầu

từ năm 2026 chưa kịp thời theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra.

3.3. Biện pháp, giải pháp khắc phục:

- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND phường triển khai công tác đầu tư công năm 2026; tham mưu chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tập trung triển khai các công trình được giao; đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công theo đúng tiến độ Tỉnh giao. Kết quả, đến ngày 27/6/2026 đã thực hiện giải ngân:

(1) Tổng vốn bố trí giải ngân đầu tư công được bố trí: 7.854 triệu đồng, trong đó: vốn Tỉnh đã phân bổ 2.850 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách phường năm 2025 phân bổ 5.004 triệu đồng.

(2) Đã thực hiện giải ngân đến ngày 27/6/2026 là 3.821/7.854 triệu đồng, bằng 48,6% (nguồn vốn đã được bố trí). Trong đó: vốn của tỉnh bố trí đã giải ngân là 1.456/2.850 triệu đồng, bằng 51,09%; vốn từ nguồn tăng thu 2.365/5.004 triệu, bằng 47,26%.


- Tham mưu tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện các công trình thực hiện đầu tư năm 2026 theo chức năng nhiệm vụ được phân công; tham mưu lãnh đạo UBND phường chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.4. Tự nhận hình thức kiểm điểm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trên đây là bản kiểm điểm trách nhiệm của bản thân trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2026

Người viết kiểm điểm

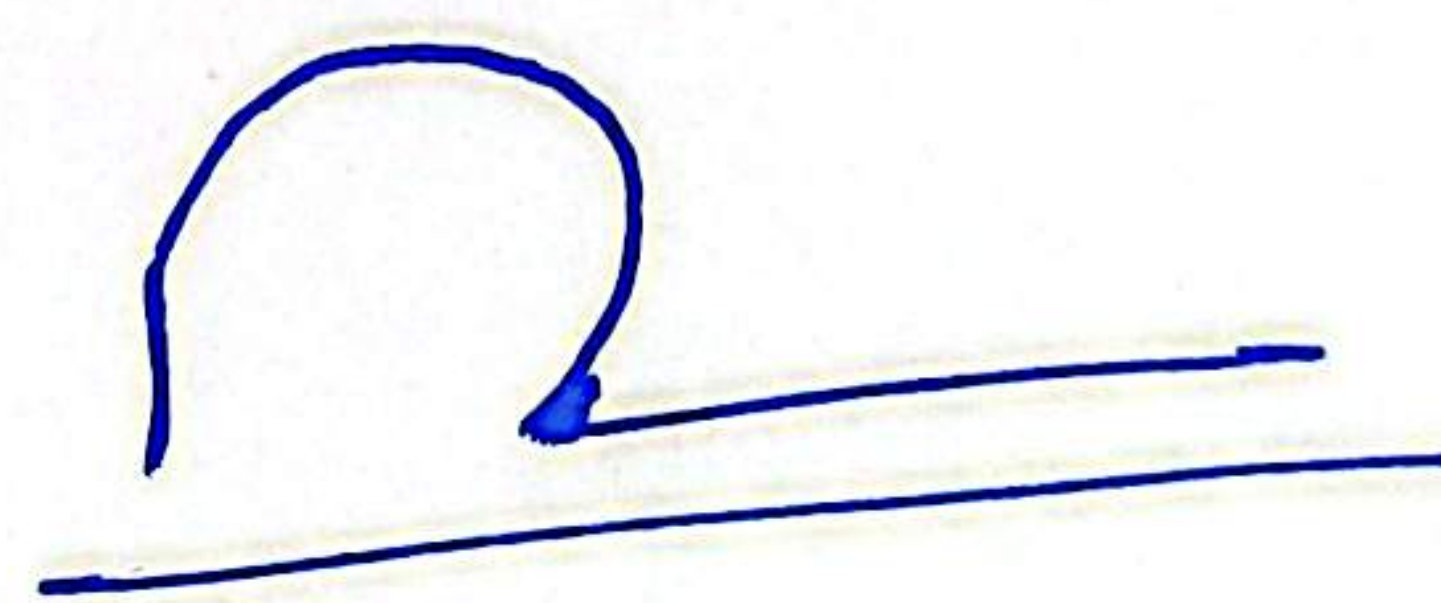

Lê Minh Túc
